

<b>XYZ CHARM 19</b>	KEMARIN	HARI INI	TOTAL	PERSENTASE	MAN POWER	
BEKISTING SLOOF	17	0	17 /19	89,47%	PABRIKASI BESI	4
URUGAN TANAH	10	4	14 /19	73,68%	PLUMBING	1
SLOOF	12	2	14 /19	73,68%	SETTING BEK.KOLOM	5
PIPA BAWAH TANAH	10	4	14 /19	73,68%	SETTING BEK.SLOOF	5
WIREMESH	10	0	10 /19	52,63%	TERAS	3
SOG	10	0	10 /19	52,63%	GALIAN DAN URUG	3
BEKISTING KOLOM LT.1	10	0	10 /19	52,63%	MANDOR	1
COR KOLOM	0	5	5 /19	26,32%		22

<b>XYZ CHARM 18</b>	KEMARIN	HARI INI	TOTAL	PERSENTASE	MAN POWER	
BEKISTING SLOOF	19	0	19 /19	100,00%		
URUGAN TANAH	10	4	14 /19	73,68%		
SLOOF	12	2	14 /19	73,68%		
PIPA BAWAH TANAH	10	4	14 /19	73,68%		
WIREMESH	10	0	10 /19	52,63%		
SOG	10	0	10 /19	52,63%		
BEKISTING KOLOM LT.1	10	0	10 /19	52,63%		
COR KOLOM	0	5	5 /19	26,32%		

**DAILY REPORT**

PROJECT NAME	PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7	DATE	<b>18 Agustus 2025</b>
CONTRACTOR	PT. JANGGAR CIPTA RANA		
LOCATION	PARK SERPONG TANGERANG		

**PEKERJAAN**

No.	ACTIVITIES	XYZ CHARM 18	XYZ CHARM 19
1	BEKISTING SLOOR	19	17
2	URUGAN TANAH	14	14
3	SLOOR	14	14
4	PIPA BAWAH TANAH	14	14
5	WIREMESH	10	10
7	SOG	10	10
8	BEKISTING KOLOM LT.1	10	10
9	COR KOLOM	5	5
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**PRODUKSI MATERIAL**

No.	STATUS	MATERIAL	JUMLAH	
			KEMARIN	HARI INI
1		PEMBESIAN		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

# DAILY REPORT

DATE

**18 Agustus 2025**

PROJECT NAME	PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7
CONTRACTOR	PT. JANGGAR CIPTA RANA
LOCATION	PARK SERPONG TANGERANG

## OPNAME MATERIAL

No.	STATUS	MATERIAL	DATANG	PERSEDIAAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10		TIDAK ADA MATERIAL		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

**DOKUMENTASI****XYZ CHARM 18**

Client : KSO Villa Permata Indah Nirwana  
Lokasi : Legok - Tangerang  
Pekerjaan : PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7  
PARK SERPONG  
No Kontrak : 0001 / PJK / VPN - TNG.23.357.30.HO / III / 2025



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI

**DOKUMENTASI****XYZ CHARM 19**

Client : KSO Villa Permata Indah Nirwana  
Lokasi : Legok - Tangerang  
Pekerjaan : PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7  
PARK SERPONG  
No Kontrak : 0001 / PJK / VPN - TNG.23.357.30.HO / III / 2025



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI



KEMARIN

HARI INI


LAPORAN CURAH HUJAN  
 PAKET PEKERJAAN :  
 PEKERJAAN RUMAH MASSAL PHASE 1 CLUSTER XYZ CHARM ZONA K7

WAKTU	Juli							Agustus																							
	Jam s/d Jam	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
00.00-01.00																															
01.00-02.00																															
02.00-03.00																															
03.00-04.00																															
04.00-05.00																															
05.00-06.00																															
06.00-07.00																															
07.00-08.00																															
08.00-09.00																															
09.00-10.00																															
10.00-11.00																															
11.00-12.00																															
12.00-13.00																															
13.00-14.00																															
14.00-15.00																															
15.00-16.00																															
16.00-17.00																															
17.00-18.00																															
18.00-19.00																															
19.00-20.00																															
20.00-21.00																															
21.00-22.00																															
22.00-23.00																															
23.00-00.00																															

Keterangan



Tanggal : 18 Agustus 2025

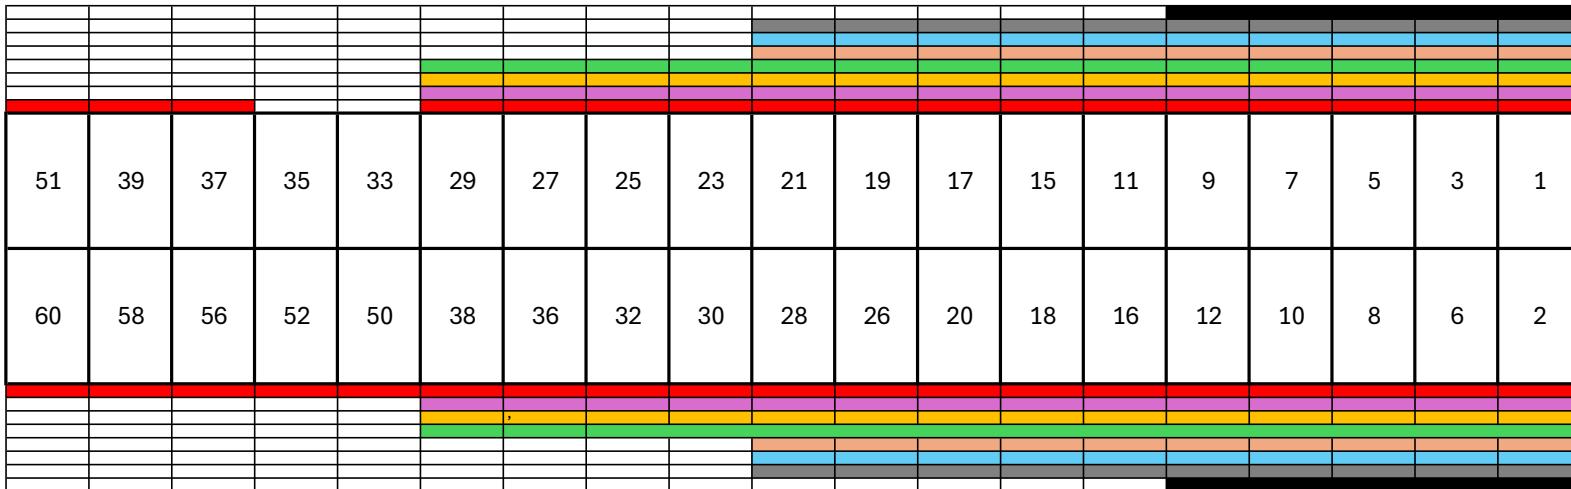

BEKISTING SLOOF	
ROW 18	19
ROW 19	17
Total Unit	36

URUGAN TANAH	
ROW 18	14
ROW 19	14
Total Unit	28

SLOOF	
ROW 18	14
ROW 19	14
Total Unit	28

PIPA BAWAH TANAH	
ROW 18	14
ROW 19	14
Total Unit	28

WIREDMESH	
ROW 18	10
ROW 19	10
Total Unit	20

SOG	
ROW 18	10
ROW 19	10
Total Unit	20

BEKISING KOLOM LT.1	
ROW 18	10
ROW 19	10
Total Unit	20

COR KOLOM LT.1	
ROW 18	5
ROW 19	5
Total Unit	10

NOTE :

1. PIPA BAWAH TANAH 23,25,27,29 & 30,32,36,38 SUDAH SET
